



Convenzione n° 5 del 03 aprile 2019 tra il
Libero Consorzio Comunale di Trapani e
l'Ufficio Speciale per la Progettazione

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA



LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI TRAPANI

VISTI E APPROVAZIONI

Libero Consorzio Comunale di Trapani
5° Settore "Ufficio Tecnico, Viabilità ed
Infrastrutture Stradali - Edilizia Scolastica
e Patrimoniale - Protezione Civile"

VISTO

Si convalida e si esprime parere favorevole
all'approvazione

n. 26145 del 15/09/2020

Il RUP


ing. Patrizia Murana

PROGETTO DEFINITIVO

Lavori di sistemazione delle condizioni di sicurezza della strada provinciale ex ASI

C.U.P. n.: H47H15001750002

C.I.G. n.: 8509375E61

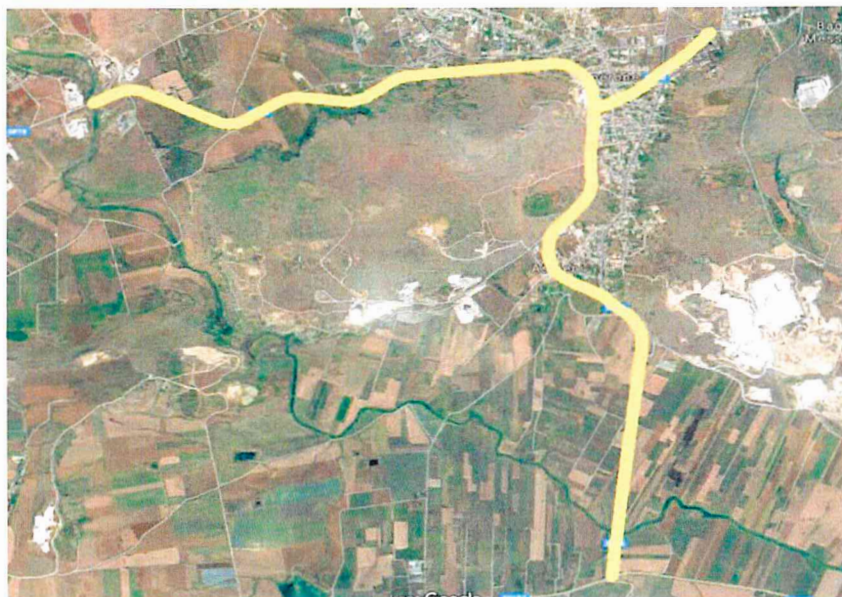

H 02

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

REVISIONE	DATA	SCALA
3°	26 AGO, 2020	

Gruppo di Progettazione:

Progettista ing. Raul Gavazzi

C.S.P. geom. Paolo Franzone



VISTO
Il Dirigente

Leonardo Santoro

REGIONE SICILIANA

Ufficio Speciale Progettazione

**Cronoprogramma di
PROGETTO**

OGGETTO: Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada provinciale ex A.S.I., sita nel comune di Custonaci (TP).

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani

Palermo, 26/08/2020

Il Tecnico
(ing. Raul Gavazzi)

Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della S.P. ex A.S.I.
L.C.C. di Trapani


Libero Consorzio Comunale di Trapani


ID	Nome attività	Durata	Importo	Gennaio 2021 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Febbraio 2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	Marzo 2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09
1	Da "Ponte Forgia" a intersezione con S.S.187	0 g	0,00			
2	IMPIANTO ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	5 g	19'280,00			
3	MOVIMENTAZIONE DI MATERIE (scavi, rilevati e rinterr) E TRASPORTO A RIFIUTO	10 g	8'837,19			
4	SMONTAGGIO GUARD-RAIL ESISTENTI E PROTEZIONI METALLICHE DAI VIADOTTI	12 g	66'037,34			
5	SCARIFICAZIONE A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	8 g	41'877,34			
6	DEMOLIZIONE GIUNTI DEL VIADOTTO	12 g	5'051,16			
7	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DEI CORDOLI IN C.A. DEI VIADOTTI	24 g	35'741,50			
8	NUOVI GIUNTI DI DILATAZIONE PER VIADOTTI	15 g	59'818,17			
9	REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE	4 g	3'342,75			
10	INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL C.A. (Cordolo, soletta e muri andatori)	51 g	190'730,85			
11	RISANAMENTO DEL DEGRADO CORTICALE DEL C.A. (Travi e pile)	36 g	26'670,00			
12	NUOVA CUNETTA IN LOCALITA' "BAGLIO CANTARRE"	5 g	5'844,90			
13	PAVIMENTAZIONE IN BITUME (Binder e Strato di usura)	11 g	81'485,08			
14	NUOVI GUARD-RAIL H1 e H2 E PANNELLI DI SICUREZZA VIADOTTI	29 g	597'279,66			
15	SEGALETICA ORIZZONTALE	6 g	24'973,50			
16	SEGNALETICA VERTICALE	10 g	15'180,50			
17	OPERE VARIE E DI FINITURA	22 g	32'329,02			
18	NOLEGGI (Piattaforma aerea, Piattaforma By-Bridge e Autogru)	47 g	27'325,44			
19	SMOBILIZZO DEL CANTIERE E PULIZIA	5 g	5'290,00			
20	Da intersezione con ex ASI in direzione S. Vito L.C.	0 g	0,00			
21	IMPIANTO ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	4 g	10'200,00			
22	SMONTAGGIO GUARD-RAIL ESISTENTI E PROTEZIONI METALLICHE DAI VIADOTTI	5 g	17'272,87			
23	SCARIFICAZIONE A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	4 g	17'162,52			
24	DEMOLIZIONE GIUNTI DEL VIADOTTO	8 g	5'051,16			
25	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DEI CORDOLI IN C.A. DEI VIADOTTI	14 g	17'188,70			
26	NUOVI GIUNTI DI DILATAZIONE PER VIADOTTI	12 g	59'818,17			
27	REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE	4 g	3'342,75			
28	INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL C.A. (Cordolo, soletta e muri andatori)	28 g	89'851,61			
29	RISANAMENTO DEL DEGRADO CORTICALE DEL C.A. (Travi e pile)	20 g	14'668,50			
30	PAVIMENTAZIONE IN BITUME (Binder e Strato di usura)	3 g	32'915,67			
31	NUOVI GUARD-RAIL H1 e H2 E PANNELLI DI SICUREZZA VIADOTTI	14 g	155'179,58			
32	SEGALETICA ORIZZONTALE	3 g	3'368,78			
33	SEGNALETICA VERTICALE	3 g	1'754,88			
34	OPERE VARIE E DI FINITURA	12 g	2'383,81			
35	NOLEGGI (Piattaforma aerea, Piattaforma By-Bridge e Autogru)	21 g	14'159,48			
36	SMOBILIZZO DEL CANTIERE E PULIZIA	5 g	6'566,37			

Legend:

- Previsione
- SAL



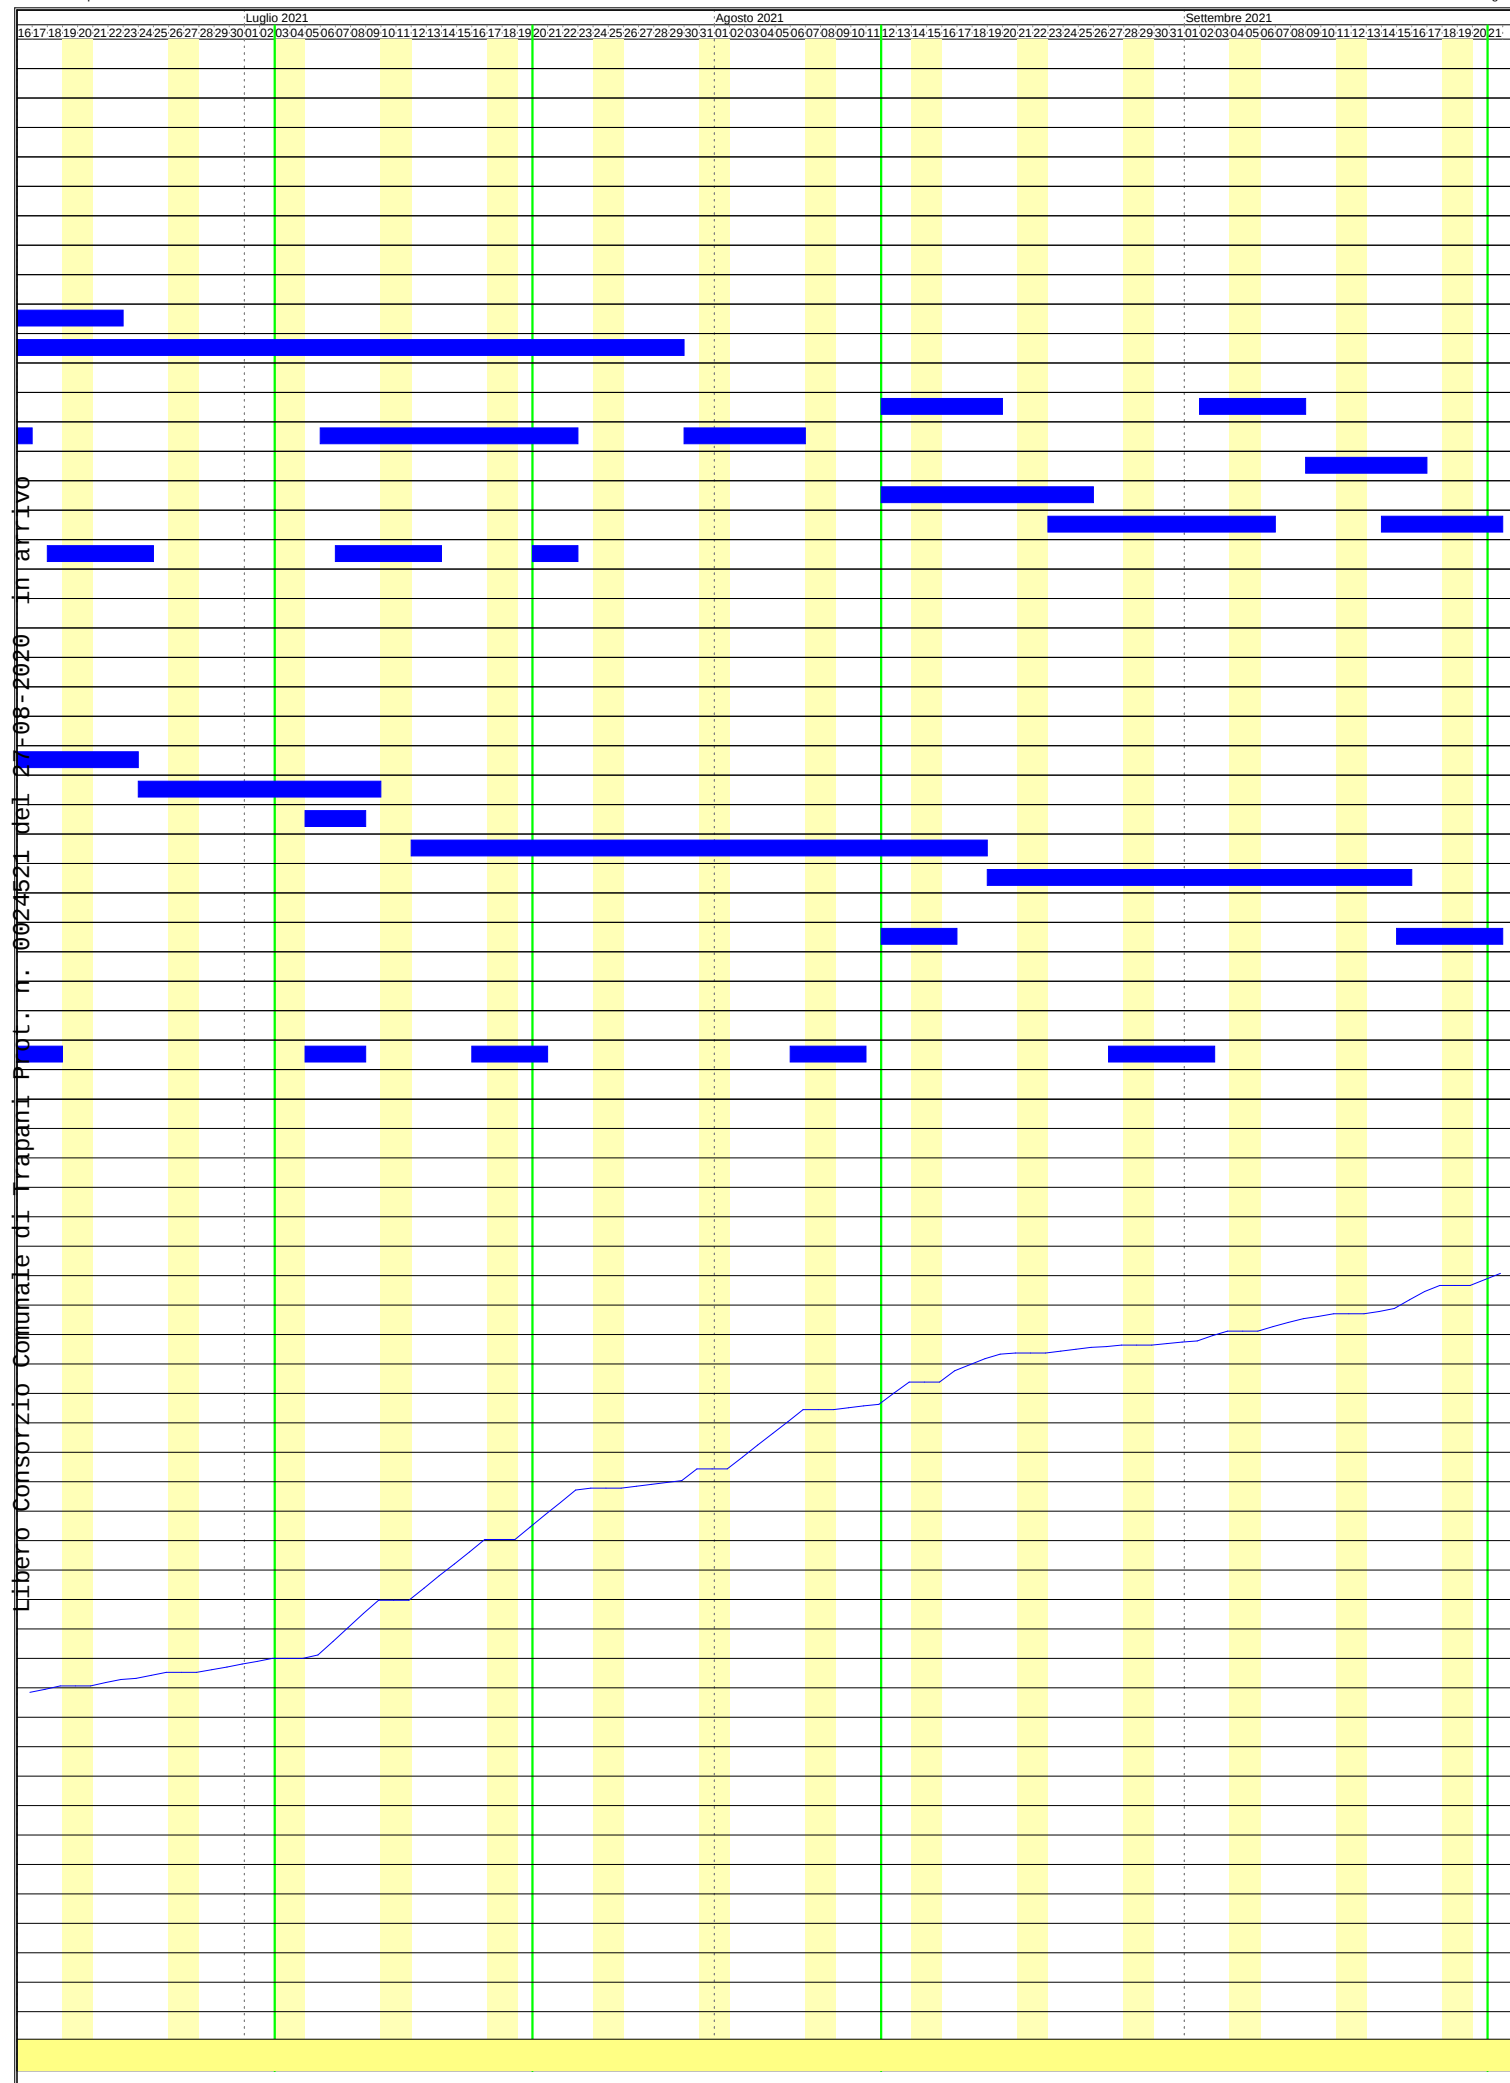

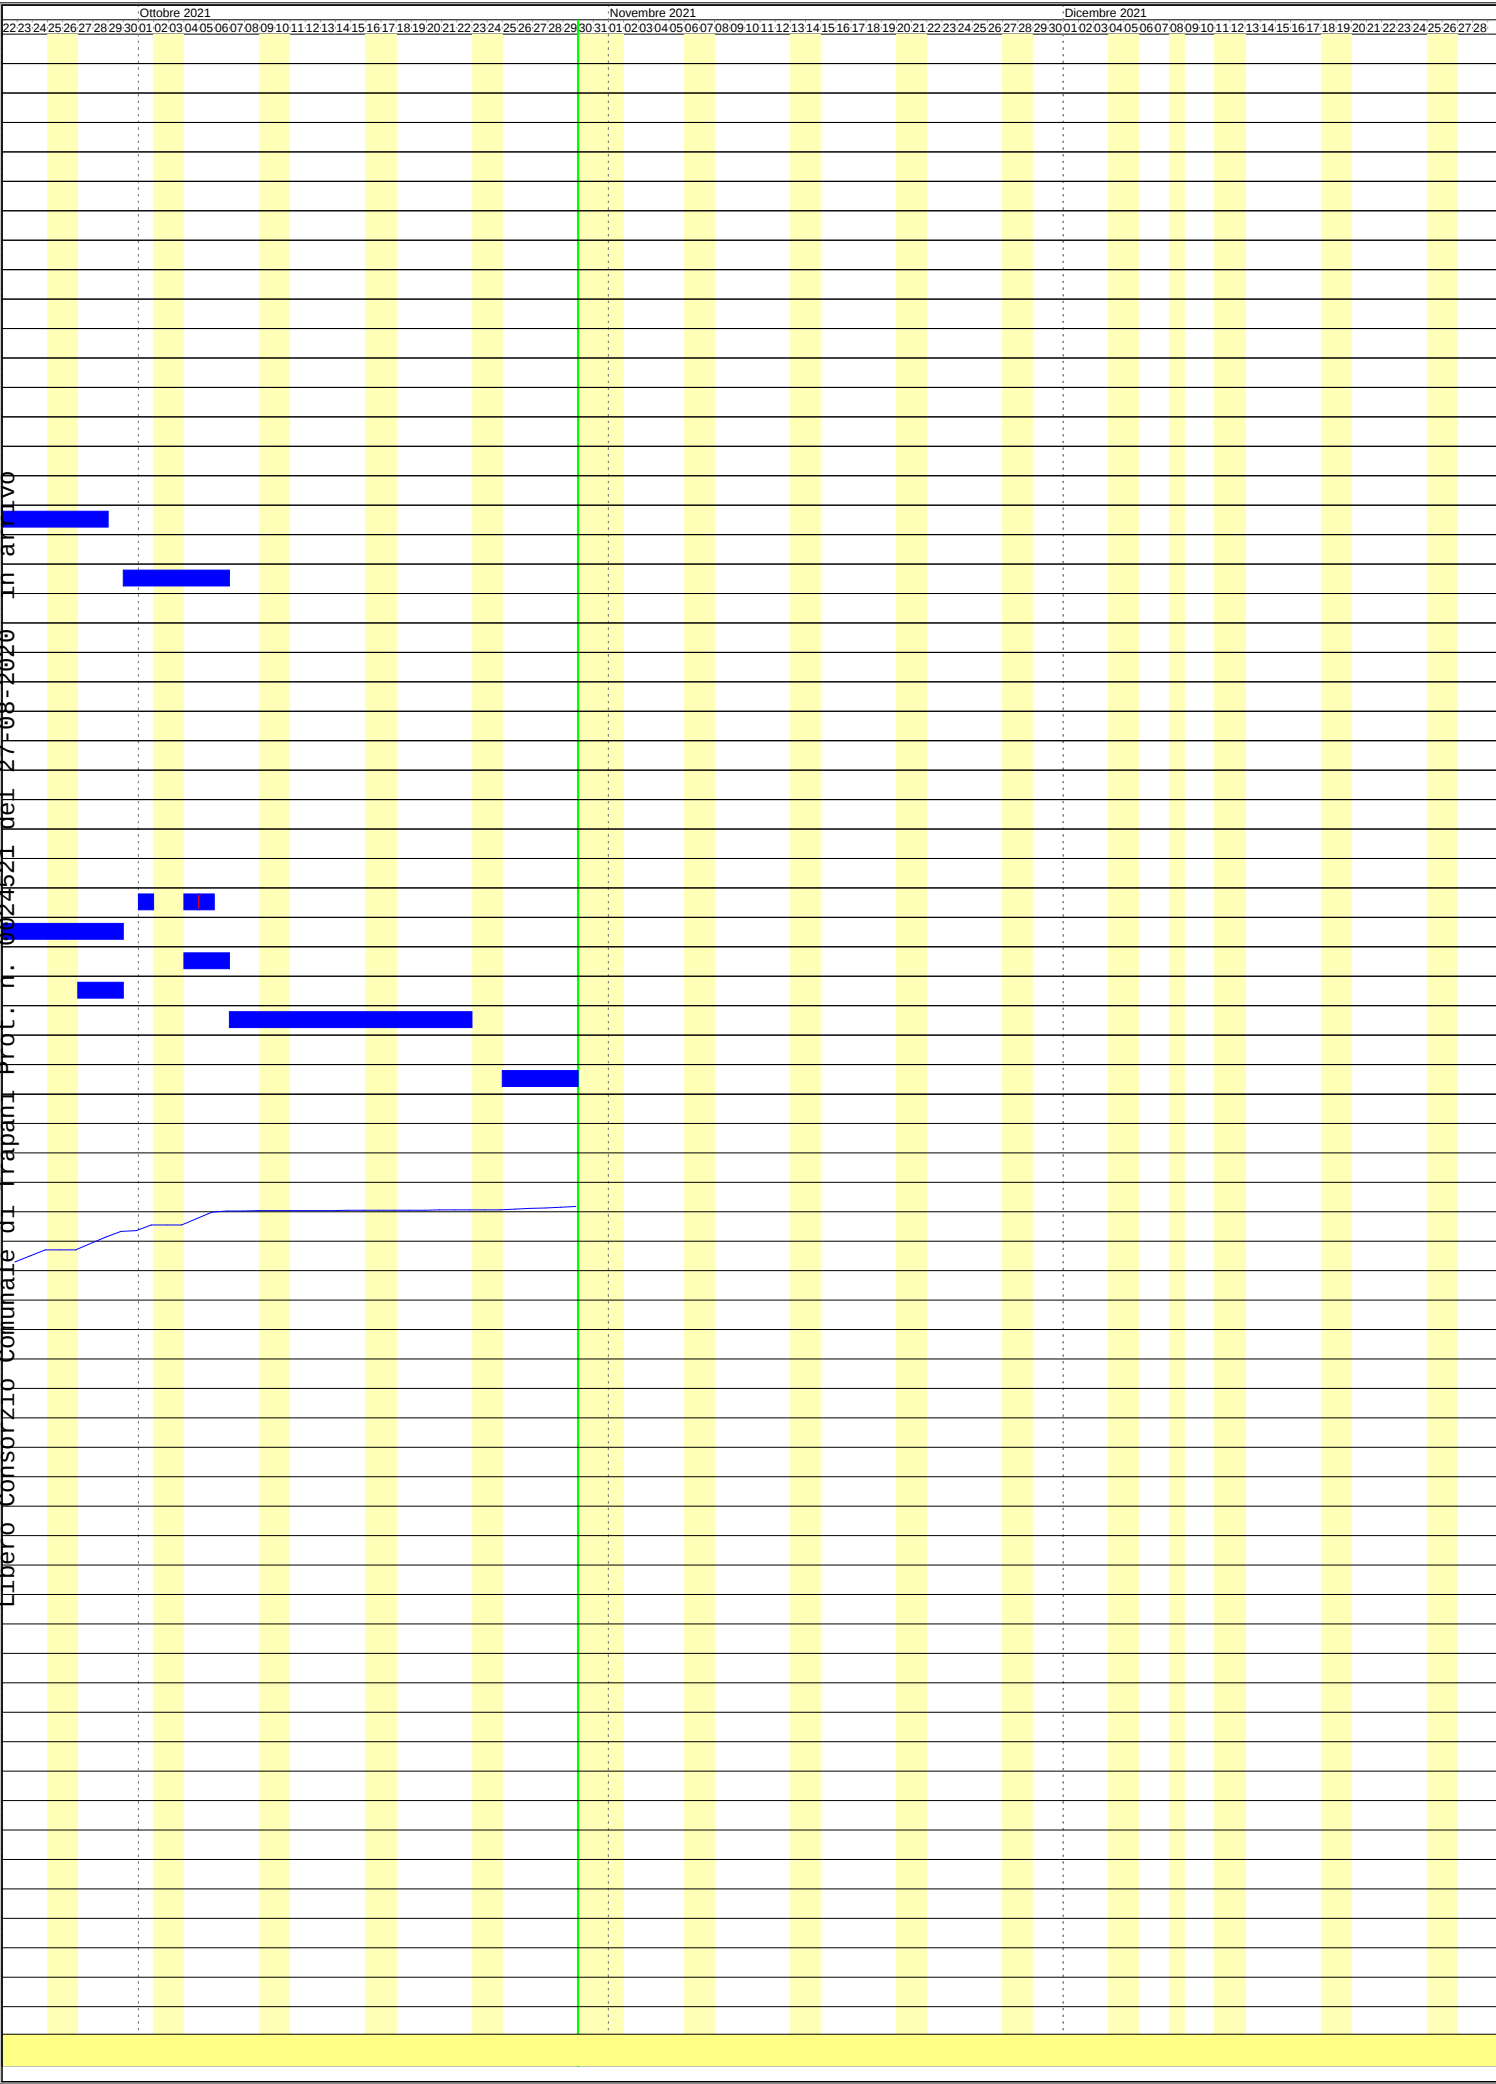

REGIONE SICILIANA

Ufficio Speciale Progettazione

Tabella Attività

OGGETTO: Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada provinciale ex A.S.I., sita nel comune di Custonaci (TP).

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani

Palermo, 26/08/2020

Il Tecnico
(ing. Raul Gavazzi)

Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della S.P. ex A.S.I.
L.C.C. di Trapani

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Da "Ponte Forgia" a intersezione con S.S.187	0,00	0,000	26/06/2020			
IMPIANTO ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	19'280,00	1,135	04/01/2021	11/01/2021	5	8
MOVIMENTAZIONE DI MATERIE (scavi, rilevati e rinterri) E TRASPORTO A RIFIUTO	8'837,19	0,520	11/01/2021	22/01/2021	10	12
SMONTAGGIO GUARD-RAIL ESISTENTI E PROTEZIONI METALLICHE DAI VIADOTTI	66'037,34	3,889	25/01/2021	09/02/2021	12	16
SCARIFICAZIONE A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	41'877,34	2,466	08/02/2021	19/05/2021	8	10
periodo 01	20'938,67	1,233	08/02/2021	11/02/2021	4	4
periodo 02	20'938,67	1,233	14/05/2021	19/05/2021	4	6
DEMOLIZIONE GIUNTI DEL VIADOTTO	5'051,16	0,297	15/02/2021	02/03/2021	12	16
DEMOLIZIONE CONTROLLATA DEI CORDOLI IN C.A. DEI VIADOTTI	35'741,50	2,105	01/03/2021	01/04/2021	24	32
NUOVI GIUNTI DI DILATAZIONE PER VIADOTTI	59'818,17	3,523	01/04/2021	22/04/2021	15	22
REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE	3'342,75	0,197	15/04/2021	20/04/2021	4	6
INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL C.A. (Cordolo, soletta e muri di fondatori)	190'730,85	11,233	12/04/2021	22/06/2021	51	72
RISANAMENTO DEL DEGRADO CORTICALE DEL C.A. (Travi e solette)	26'670,00	1,571	10/06/2021	29/07/2021	36	50
NUOVA CUNETTA IN LOCALITA' "BAGLIO CANTARRE"	5'844,90	0,344	25/01/2021	29/01/2021	5	5
PAVIMENTAZIONE IN BITUME (Binder e Strato di usura)	81'485,08	4,799	12/08/2021	08/09/2021	11	15
periodo 01	44'816,79	2,639	12/08/2021	19/08/2021	6	8
periodo 02	36'668,29	2,160	02/09/2021	08/09/2021	5	7
NUOVI GUARD-RAIL H1 e H2 E PANNELLI DI SICUREZZA VIADOTTI	597'279,66	35,176	03/06/2021	06/08/2021	29	39
periodo 01	203'075,08	11,960	03/06/2021	16/06/2021	10	14
periodo 02	268'775,85	15,829	06/07/2021	22/07/2021	13	17
periodo 03	125'428,73	7,387	30/07/2021	06/08/2021	6	8
SEGNALETICA ORIZZONTALE	24'973,50	1,471	09/09/2021	16/09/2021	6	8
SEGNALETICA VERTICALE	15'180,50	0,894	12/08/2021	25/08/2021	10	14
OPERE VARIE E DI FINITURA	32'329,02	1,904	23/08/2021	28/09/2021	22	30
periodo 01	16'164,51	0,952	23/08/2021	06/09/2021	11	15
periodo 02	16'164,51	0,952	14/09/2021	28/09/2021	11	15
NOLEGGI (Piattaforma aerea, Piattaforma By-Bridge e Autogru)	27'325,44	1,609	04/03/2021	22/07/2021	47	66
periodo 01	4'645,32	0,274	04/03/2021	15/03/2021	8	12
periodo 02	4'645,32	0,274	25/03/2021	06/04/2021	8	13
periodo 03	546,51	0,032	19/04/2021	19/04/2021	1	1
periodo 04	1'093,02	0,064	20/04/2021	21/04/2021	2	2
periodo 05	3'005,80	0,177	23/04/2021	29/04/2021	5	7
periodo 06	3'005,80	0,177	07/05/2021	13/05/2021	5	7
periodo 07	3'005,80	0,177	21/05/2021	27/05/2021	5	7
periodo 08	3'005,80	0,177	18/06/2021	24/06/2021	5	7
periodo 09	3'005,80	0,177	07/07/2021	13/07/2021	5	7
periodo 10	1'366,27	0,080	20/07/2021	22/07/2021	3	3
SMOBILIZZO DEL CANTIERE E PULIZIA	5'290,00	0,312	30/09/2021	06/10/2021	5	7

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Da intersezione con ex ASI in direzione S. Vito L.C.	0,00	0,000	26/06/2020			
IMPIANTO ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	10'200,00	0,601	13/05/2021	18/05/2021	4	6
SMONTAGGIO GUARD-RAIL ESISTENTI E PROTEZIONI METALLICHE DAI VIADOTTI	17'272,87	1,017	17/05/2021	21/05/2021	5	5
SCARIFICAZIONE A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	17'162,52	1,011	21/05/2021	26/05/2021	4	6
periodo 01	8'581,26	0,505	21/05/2021	24/05/2021	2	4
periodo 02	8'581,26	0,505	25/05/2021	26/05/2021	2	2
DEMOLIZIONE GIUNTI DEL VIADOTTO	5'051,16	0,297	27/05/2021	08/06/2021	8	13
DEMOLIZIONE CONTROLLATA DEI CORDOLI IN C.A. DEI VIADOTTI	17'188,70	1,012	04/06/2021	23/06/2021	14	20
NUOVI GIUNTI DI DILATAZIONE PER VIADOTTI	59'818,17	3,523	24/06/2021	09/07/2021	12	16
REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE	3'342,75	0,197	05/07/2021	08/07/2021	4	4
INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL C.A. (Cordolo, soletta e muri di fondatori)	89'851,61	5,292	12/07/2021	18/08/2021	28	38
CRISANAMENTO DEL DEGRADO CORTICALE DEL C.A. (Travi e pile)	14'668,50	0,864	19/08/2021	15/09/2021	20	28
PAVIMENTAZIONE IN BITUME (Binder e Strato di usura)	32'915,67	1,939	01/10/2021	05/10/2021	3	3
periodo 01	10'862,17	0,640	01/10/2021	01/10/2021	1	1
periodo 02	10'862,17	0,640	04/10/2021	04/10/2021	1	1
periodo 03	11'191,33	0,659	05/10/2021	05/10/2021	1	1
NUOVI GUARD-RAIL H1 e H2 E PANNELLI DI SICUREZZA VIADOTTI	155'179,58	9,139	12/08/2021	29/09/2021	14	20
periodo 01	32'587,71	1,919	12/08/2021	16/08/2021	3	5
periodo 02	122'591,87	7,220	15/09/2021	29/09/2021	11	15
SEGNALETICA ORIZZONTALE	3'368,78	0,198	04/10/2021	06/10/2021	3	3
SEGNALETICA VERTICALE	1'754,88	0,103	27/09/2021	29/09/2021	3	3
OPERE VARIE E DI FINITURA	2'383,81	0,140	07/10/2021	22/10/2021	12	16
MOLEGGI (Piattaforma aerea, Piattaforma By-Bridge e Autogru)	14'159,48	0,834	03/06/2021	02/09/2021	21	27
periodo 01	1'415,95	0,083	03/06/2021	04/06/2021	2	2
periodo 02	2'690,30	0,158	15/06/2021	18/06/2021	4	4
periodo 03	2'690,30	0,158	05/07/2021	08/07/2021	4	4
periodo 04	1'982,33	0,117	16/07/2021	20/07/2021	3	5
periodo 05	1'982,33	0,117	06/08/2021	10/08/2021	3	5
periodo 06	3'398,28	0,200	27/08/2021	02/09/2021	5	7
SMOBILIZZO DEL CANTIERE E PULIZIA	6'566,37	0,387	25/10/2021	29/10/2021	5	5
Palermo, 26/08/2020						
Tecnico ing. Raul Gavazzi						

REGIONE SICILIANA

Ufficio Speciale Progettazione

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada provinciale ex A.S.I., sita nel comune di Custonaci (TP).

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani

Palermo, 26/08/2020

Il Tecnico
(ing. Raul Gavazzi)

Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della S.P. ex A.S.I.
L.C.C. di Trapani

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
04/01/2021	3'856,00	3'856,00	0,227
05/01/2021	3'856,00	7'712,00	0,454
07/01/2021	3'856,00	11'568,00	0,681
08/01/2021	3'856,00	15'424,00	0,908
11/01/2021	4'739,72	20'163,72	1,188
12/01/2021	883,72	21'047,44	1,240
13/01/2021	883,72	21'931,16	1,292
14/01/2021	883,72	22'814,88	1,344
15/01/2021	883,72	23'698,60	1,396
18/01/2021	883,72	24'582,31	1,448
19/01/2021	883,72	25'466,03	1,500
20/01/2021	883,72	26'349,75	1,552
21/01/2021	883,72	27'233,47	1,604
22/01/2021	883,72	28'117,19	1,656
25/01/2021	6'672,09	34'789,28	2,049
26/01/2021	6'672,09	41'461,37	2,442
27/01/2021	6'672,09	48'133,47	2,835
28/01/2021	6'672,09	54'805,56	3,228
29/01/2021	6'672,09	61'477,65	3,621
01/02/2021	5'503,11	66'980,76	3,945
02/02/2021	5'503,11	72'483,87	4,269
03/02/2021	5'503,11	77'986,98	4,593
04/02/2021	5'503,11	83'490,10	4,917
05/02/2021	5'503,11	88'993,21	5,241
08/02/2021	10'737,78	99'730,99	5,874
09/02/2021	10'737,78	110'468,76	6,506
10/02/2021	5'234,67	115'703,43	6,814
11/02/2021	5'234,67	120'938,10	7,122
15/02/2021	420,93	121'359,03	7,147
16/02/2021	420,93	121'779,96	7,172
17/02/2021	420,93	122'200,89	7,197
18/02/2021	420,93	122'621,82	7,222
19/02/2021	420,93	123'042,75	7,246
22/02/2021	420,93	123'463,68	7,271
23/02/2021	420,93	123'884,61	7,296
24/02/2021	420,93	124'305,54	7,321
25/02/2021	420,93	124'726,47	7,346
26/02/2021	420,93	125'147,40	7,370
01/03/2021	1'910,16	127'057,56	7,483
02/03/2021	1'910,16	128'967,72	7,595
03/03/2021	1'489,23	130'456,95	7,683
04/03/2021	2'069,89	132'526,84	7,805
05/03/2021	2'069,89	134'596,74	7,927
08/03/2021	2'069,89	136'666,63	8,049
09/03/2021	2'069,89	138'736,53	8,171
10/03/2021	2'069,89	140'806,42	8,293
11/03/2021	2'069,89	142'876,32	8,414
12/03/2021	2'069,89	144'946,21	8,536
15/03/2021	2'069,89	147'016,10	8,658
16/03/2021	1'489,23	148'505,33	8,746
17/03/2021	1'489,23	149'994,56	8,834
18/03/2021	1'489,23	151'483,79	8,921
19/03/2021	1'489,23	152'973,02	9,009
22/03/2021	1'489,23	154'462,25	9,097
23/03/2021	1'489,23	155'951,48	9,185
24/03/2021	1'489,23	157'440,71	9,272
25/03/2021	2'069,89	159'510,60	9,394
26/03/2021	2'069,89	161'580,50	9,516
29/03/2021	2'069,89	163'650,39	9,638
30/03/2021	2'069,89	165'720,29	9,760
31/03/2021	2'069,89	167'790,18	9,882
01/04/2021	6'057,77	173'847,96	10,239
02/04/2021	4'568,54	178'416,50	10,508

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
06/04/2021	4'568,54	182'985,04	10,777
07/04/2021	3'987,88	186'972,92	11,011
08/04/2021	3'987,88	190'960,80	11,246
09/04/2021	3'987,88	194'948,68	11,481
12/04/2021	7'727,70	202'676,38	11,936
13/04/2021	7'727,70	210'404,07	12,391
14/04/2021	7'727,70	218'131,77	12,847
15/04/2021	8'563,39	226'695,16	13,351
16/04/2021	8'563,39	235'258,55	13,855
19/04/2021	9'109,89	244'368,44	14,392
20/04/2021	9'109,90	253'478,34	14,928
21/04/2021	8'274,21	261'752,55	15,416
22/04/2021	7'727,70	269'480,25	15,871
23/04/2021	4'340,98	273'821,23	16,126
26/04/2021	4'340,98	278'162,21	16,382
27/04/2021	4'340,98	282'503,19	16,638
28/04/2021	4'340,98	286'844,17	16,893
29/04/2021	4'340,98	291'185,15	17,149
30/04/2021	3'739,82	294'924,97	17,369
03/05/2021	3'739,82	298'664,79	17,589
04/05/2021	3'739,82	302'404,61	17,810
05/05/2021	3'739,82	306'144,43	18,030
06/05/2021	3'739,82	309'884,25	18,250
07/05/2021	4'340,98	314'225,23	18,506
10/05/2021	4'340,98	318'566,21	18,761
11/05/2021	4'340,98	322'907,19	19,017
12/05/2021	4'340,98	327'248,17	19,273
13/05/2021	6'890,98	334'139,15	19,679
14/05/2021	11'524,49	345'663,64	20,357
17/05/2021	14'979,06	360'642,70	21,240
18/05/2021	14'979,06	375'621,76	22,122
19/05/2021	12'429,06	388'050,83	22,854
20/05/2021	7'194,39	395'245,22	23,277
21/05/2021	12'086,18	407'331,40	23,989
24/05/2021	8'631,61	415'963,01	24,498
25/05/2021	8'631,61	424'594,62	25,006
26/05/2021	8'631,61	433'226,23	25,514
27/05/2021	4'972,38	438'198,61	25,807
28/05/2021	4'371,22	442'569,82	26,065
31/05/2021	4'371,22	446'941,04	26,322
01/06/2021	4'371,22	451'312,26	26,579
03/06/2021	25'386,70	476'698,95	28,074
04/06/2021	26'614,46	503'313,42	29,642
07/06/2021	25'906,49	529'219,90	31,168
08/06/2021	25'906,49	555'126,40	32,693
09/06/2021	25'275,09	580'401,49	34,182
10/06/2021	26'015,93	606'417,42	35,714
11/06/2021	26'015,93	632'433,34	37,246
14/06/2021	26'015,93	658'449,27	38,778
15/06/2021	26'688,50	685'137,77	40,350
16/06/2021	26'688,50	711'826,28	41,922
17/06/2021	6'380,99	718'207,27	42,298
18/06/2021	6'982,15	725'189,42	42,709
21/06/2021	6'309,58	731'499,00	43,081
22/06/2021	6'309,58	737'808,58	43,452
23/06/2021	2'569,75	740'378,33	43,603
24/06/2021	6'326,84	746'705,17	43,976
25/06/2021	5'725,68	752'430,85	44,313
28/06/2021	5'725,68	758'156,53	44,651
29/06/2021	5'725,68	763'882,21	44,988
30/06/2021	5'725,68	769'607,89	45,325
01/07/2021	5'725,68	775'333,57	45,662
02/07/2021	5'725,68	781'059,26	45,999

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
05/07/2021	7'233,94	788'293,20	46,425
06/07/2021	27'909,01	816'202,21	48,069
07/07/2021	28'510,17	844'712,38	49,748
08/07/2021	28'510,17	873'222,55	51,427
09/07/2021	27'001,91	900'224,46	53,017
12/07/2021	25'226,04	925'450,50	54,503
13/07/2021	25'226,04	950'676,54	55,989
14/07/2021	24'624,88	975'301,43	57,439
15/07/2021	24'624,88	999'926,31	58,889
16/07/2021	25'285,66	1'025'211,97	60,378
19/07/2021	25'285,66	1'050'497,63	61,868
20/07/2021	25'741,08	1'076'238,72	63,384
21/07/2021	25'080,31	1'101'319,03	64,861
22/07/2021	25'080,30	1'126'399,33	66,338
23/07/2021	3'949,82	1'130'349,15	66,570
26/07/2021	3'949,82	1'134'298,97	66,803
27/07/2021	3'949,82	1'138'248,79	67,035
28/07/2021	3'949,82	1'142'198,61	67,268
29/07/2021	3'949,82	1'146'148,42	67,501
30/07/2021	24'113,77	1'170'262,20	68,921
02/08/2021	24'113,77	1'194'375,97	70,341
03/08/2021	24'113,77	1'218'489,75	71,761
04/08/2021	24'113,77	1'242'603,52	73,181
05/08/2021	24'113,77	1'266'717,30	74,601
06/08/2021	24'774,55	1'291'491,85	76,061
09/08/2021	3'869,76	1'295'361,61	76,288
10/08/2021	3'869,76	1'299'231,37	76,516
11/08/2021	3'208,99	1'302'440,36	76,705
12/08/2021	23'059,07	1'325'499,43	78,063
13/08/2021	23'059,07	1'348'558,50	79,421
16/08/2021	23'059,07	1'371'617,57	80,779
17/08/2021	12'196,50	1'383'814,08	81,498
18/08/2021	12'196,51	1'396'010,58	82,216
19/08/2021	9'720,94	1'405'731,52	82,788
20/08/2021	2'251,48	1'407'983,00	82,921
23/08/2021	3'720,98	1'411'703,97	83,140
24/08/2021	3'720,98	1'415'424,95	83,359
25/08/2021	3'720,98	1'419'145,93	83,579
26/08/2021	2'202,93	1'421'348,85	83,708
27/08/2021	2'882,58	1'424'231,43	83,878
30/08/2021	2'882,58	1'427'114,01	84,048
31/08/2021	2'882,58	1'429'996,59	84,218
01/09/2021	2'882,58	1'432'879,17	84,387
02/09/2021	10'216,24	1'443'095,42	84,989
03/09/2021	9'536,58	1'452'632,00	85,551
06/09/2021	9'536,58	1'462'168,58	86,112
07/09/2021	8'067,08	1'470'235,67	86,587
08/09/2021	8'067,09	1'478'302,75	87,062
09/09/2021	4'895,68	1'483'198,43	87,351
10/09/2021	4'895,68	1'488'094,10	87,639
13/09/2021	4'895,68	1'492'989,78	87,927
14/09/2021	6'365,18	1'499'354,95	88,302
15/09/2021	17'509,90	1'516'864,85	89,334
16/09/2021	16'776,47	1'533'641,31	90,322
17/09/2021	12'614,22	1'546'255,53	91,064
20/09/2021	12'614,22	1'558'869,75	91,807
21/09/2021	12'614,22	1'571'483,96	92,550
22/09/2021	12'614,22	1'584'098,18	93,293
23/09/2021	12'614,22	1'596'712,40	94,036
24/09/2021	12'614,22	1'609'326,61	94,779
27/09/2021	13'199,18	1'622'525,79	95,556
28/09/2021	13'199,18	1'635'724,96	96,334
29/09/2021	11'729,68	1'647'454,64	97,024

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
30/09/2021	1'058,00	1'648'512,64	97,087
01/10/2021	11'920,17	1'660'432,81	97,789
04/10/2021	13'043,10	1'673'475,91	98,557
05/10/2021	13'372,26	1'686'848,17	99,344
06/10/2021	2'180,93	1'689'029,10	99,473
07/10/2021	198,65	1'689'227,75	99,485
08/10/2021	198,65	1'689'426,40	99,496
11/10/2021	198,65	1'689'625,05	99,508
12/10/2021	198,65	1'689'823,70	99,520
13/10/2021	198,65	1'690'022,35	99,531
14/10/2021	198,65	1'690'221,00	99,543
15/10/2021	198,65	1'690'419,65	99,555
18/10/2021	198,65	1'690'618,31	99,566
19/10/2021	198,65	1'690'816,96	99,578
20/10/2021	198,65	1'691'015,61	99,590
21/10/2021	198,65	1'691'214,26	99,602
22/10/2021	198,65	1'691'412,91	99,613
25/10/2021	1'313,27	1'692'726,18	99,691
26/10/2021	1'313,27	1'694'039,46	99,768
27/10/2021	1'313,27	1'695'352,73	99,845
28/10/2021	1'313,27	1'696'666,00	99,923
29/10/2021	1'313,27	1'697'979,27	100,000
Palermo, 26/08/2020			
Tecnico ing. Raul Gavazzi			
